



上海康定能源投资有限公司
Shanghai KD Energy Investment Co.,Ltd.

奉贤基地项目

工程简报

2015年8月15日第6期

项目名称：上海华怡（企业）集团有限公司奉贤基地项目工程

业主名：上海华怡（企业）集团有限公司

施工承包单位：浙江润宇建设有限公司

监理单位：上海智达工程顾问有限公司

一 工程综述：



项目建设地位于奉贤区，西至环城东路，南至狄家港，北至恒域置业，地上建筑4-20层，工程占地面积约19,962M²，总建筑面积60082.54M²（其中地上

建筑面积为50568.42M²，地下建筑面积为9514.12M²），总投资约1.43亿元。

二、工程进度

- 1、6#房 B1 层结构混凝土浇筑完成；
- 2、3#房 2#房垫层、防水层、保护层完成；
- 3、6#房南侧外墙回填土完成；
- 4、1#房北侧垫层浇筑完成 80%；
- 5、1#房南侧砖胎模完成 30%

三、工作量 截止 2015 年 6 月 30 日

七月份进度汇总表

序号	项目名称	造价 (元)
1	土建部分	5855414.33
2	基坑围护	792997.85
合计		13808412.18

奉贤基地项目汇总表

序号	日期	造价 (元)
1	5 月份	7166669.00
2	6 月份	958168.00
3	7 月份	13808412.00
合计		21933249.00


四、安全生产

- 1、本月无安全事故发生，施工单位安全生产保证体系正常运行，安全员在岗，严格按照安全保证体系进行施工管理；
- 2、本月安全文明施工内容主要为临时用电、基坑临边防护、场容场帽及保洁扬尘控制。

五、工作计划

- 1、1#房南侧基础砖模、垫层、截桩、接桩完成，1#房北侧基础钢筋绑扎完成 25%；
1#房北侧基础截桩、接桩、垫层完成；
- 2、2#房基础钢筋绑扎完成 50%
- 3、3#房基础钢筋绑扎完成；
- 4、4#房 B1 层结构排架搭设、平台模板完成；
- 5、5#房 6#房基础回填土完成脚手架基础完成；
- 6、5#房一层排架搭设、平台模板完成 80%；
- 7、6#房一层排架搭设、平台模板完成 50%

六、现场照片

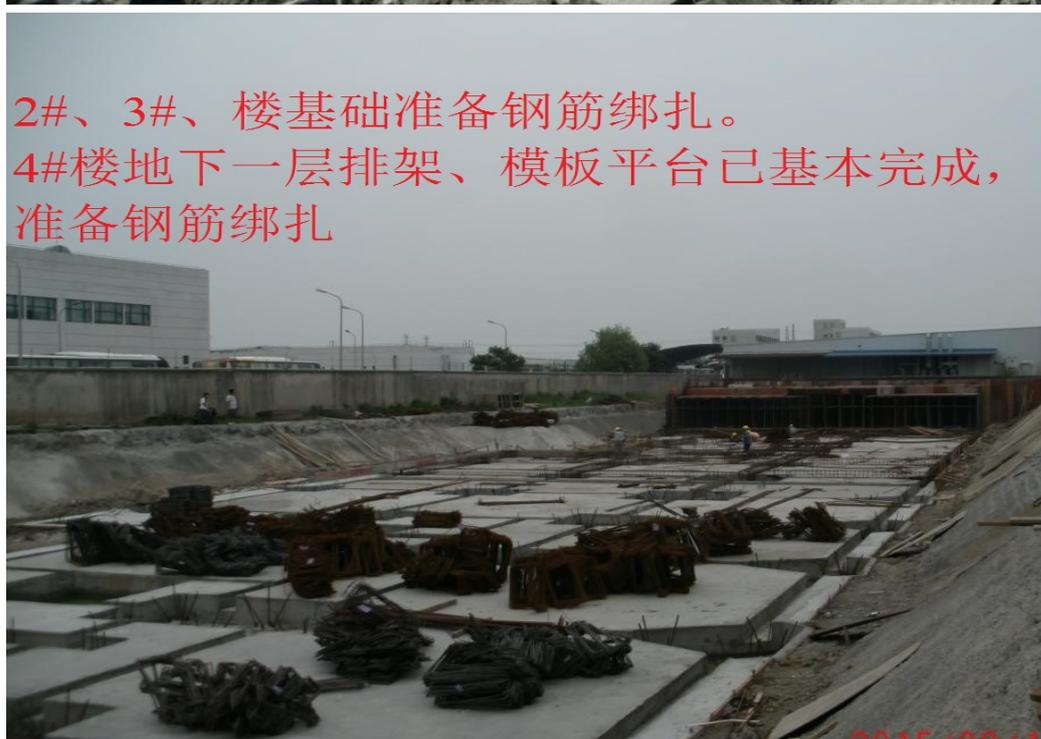

5#、6#楼地下室外墙已回填土，细石砼地面硬化后准备外脚手架搭设



6#楼、5#楼外墙防水已施工，正在贴防水保护层，准备回填土施工
